2026年03月27日(金)

(仮称)摂津市立味生コミュニティセンター新築工事

4月度　月間工程表

工期	令和7年10月30日～令和9年3月12日
構造	RC造3階
建築面積	615.06㎡
延べ床面積	1540.37㎡

所　長	担　当

種　目

2026年3月
14土 15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 22日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火

2026年4月
1水 2木 3金 4土 5日 6月 7火 8水 9木 10金 11土 12日 13月 14火 15水 16木 17金 18土 19日 20月 21火 22水 23木 24金 25土 26日 27月 28火 29水 30木

2026年5月
1金 2土 3日 4月 5火 6水 7木 8金 9土 10日 11月 12火

仮設工事

仮設電気工事
通路足場
通路足場解体

基礎工事

基礎型枠
基礎・地中梁 ③工区 CON 94.5m3
地中梁 配筋
打継処理
基礎配筋
ｴｱﾌｪﾝｽ仕込
基礎・地中梁 ②工区 CON 110m3
セパ埋め
配管ピット 簡易防水
杭頭補強筋 溶接

土工事

キーストン型枠
捨CON
墨出
捨枠
基礎・地中梁 ①工区 CON 101m3
打継処理
型枠脱型
土工事
掘削土量 約８００m3
休暇期間
土間ｼｰﾄ ｽﾀｲﾛ貼り

設備工事

スリーブ墨出
スリーブ入れ

基礎階

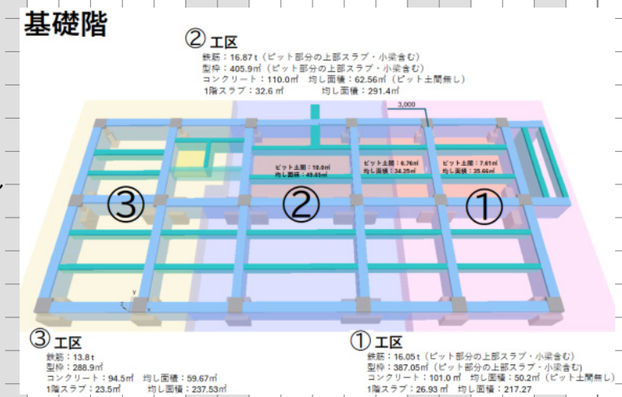

村本建設株式会社　大阪支店
