作成日：2026年 9月10日

2026年 10月　月間工程表

請負者名：西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体
工事名称：京都線（摂津市駅付近）連続立体交差工事（第2工区）に伴う2026年度土木工事

阪急電鉄㈱	阪急設計コンサルタント㈱	西松建設・ハンシン建設特定建設工事共同企業体（第2工区）	
		現場代理人	監理技術者
			JV職員


工種	数量等	2026年9月										2026年10月																										2026年11月								備考					
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
2026年度土木工事																																																			
摂津市駅東側ロータリー																																																			
仮駅地下横断通路工																																																			
函渠工	巻桁部																																																		
	上り線側				型枠脱型				アンカー打設																																						壁・スラブ型枠組立				
	下り線側						底版型枠組立			防水シート設置									底版鉄筋組立						底版型枠組	CON打設																									
	EVシャフト部				型枠脱型											壁鉄筋組立	壁型枠組立									CON打設		支保工組立			壁内型枠組	壁鉄筋組立												壁外枠組立							
	階段部				底版鉄筋組立																								型枠脱型		支保工組立							スラブ底型枠組立						壁部・スラブ鉄筋組立							
阪急レンタサイクル摂津　付近																																																			
仮設工					仮囲い設置																																														
									仮設電気引込																																										
支障物撤去工					植栽・支障物撤去																									レンタサイクル撤去																					
																掘削・土砂運搬																																			
境川仮河川ボックス																																																			
薬液注入工																														薬液注入工																				渇水期　10/16 ～ 6/15	
撤去工																水位計移設																																			
2025年度土木工事																																																			
家屋調査					家屋調査																																														
道路規制																																																			
近接作業	京都線				○											○														○				○										○							
線路閉鎖	京都線																																																		
近接夜間作業	京都線																																																		
一般夜間作業	京都線								○	○																				○	○	○	○	○																	
軌道警戒・相番作業（連立工事）	京都線																																																		
軌道警戒・相番作業（委託工事）	京都線																																																		
信通立会・電気立会	京都線																																																		
検電接地必要作業	京都線																																																		
高圧停電必要作業	京都線																																																		
保安停電作業	京都線																																																		

記　事
——　：昼間作業
——　：夜間作業

凡例
：今月の施工範囲
：道路規制

事業概要につきましては、このQRコードよりご覧いただけます。

函渠工平面図

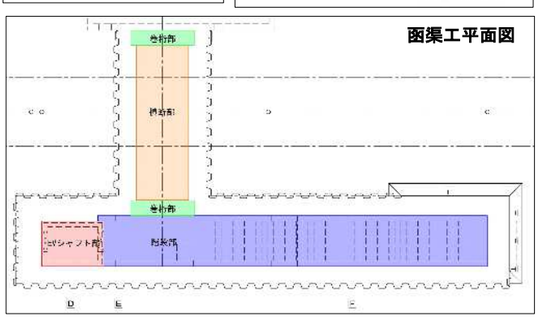

躯体毎進捗状況

Pt15	Rc16	Ct16	Rc17	Cs17	Rc18	Ph18	P19	Ph19	Rc20	Ct20	Rc21	Pt21	Rc22	Pt22
未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工	未施工

第2工区全体平面図

